

СИСТЕМАТА LOTNAR И ПРОГНОЗИТЕ ЗА ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПТП



Добромир Василев
експерт "Финансов контрол",
ОПТП

Комитет за наблюдение на ОПТП
6 юни 2008 г., гр. Кюстендил



СЪДЪРЖАНИЕ

- Правилото $N+2$, $N+3$
- Представяне на системата LOTNAR
- Прогнози за финансовото изпълнение на ОПТП



ПРАВИЛО “N+2, N+3” - РЕГЛАМЕНТ 1083 ЧЛ. 93

Принципи

- Комисията автоматично освобождава частта от бюджетния ангажимент за оперативна програма, която не е била използвана за предварителни или междинни плащания или за която не е било изпратено заявление в съответствие с член 86 до 31 декември на втората година, след тази на бюджетното задължение по програмата с изключението, посочено в параграф 2.
- За държави-членки, чийто БВП от 2001 г. до 2003 г. е бил по-малък от 85 % от средния на ЕС-25 за същия период, както са изброени в приложение II, посоченият в параграф 1 срок е 31 декември от третата година, следваща годината на годишния ангажимент от бюджета от 2007 г. до 2010 г. по техните оперативни програми.

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ПОСЛЕДИЦИ

- Правилото **N+2, N+3** ограничава времевия период, в които една ОП разполага с отделен годишен кредит до максимум от 4 години.
- Всяка една Оперативна програма трябва да изгради система за наблюдение на изпълнението на правилото **N+2, N+3** още в началото на програмният период.
- За да е ефективната системата за наблюдение трябва да определят реални годишни цели, които ОП може да постигне.

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОДОБРЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА




ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

ЦЕЛИ НА ОПТП, ЗА ДА СЕ СПАЗИ ПРАВИЛОТО N+2, N+3

- Поради профила на България (ангажиментите за 2007 г. са 2,5 пъти по-малко от тези за 2013 г.) и спецификите на правилото **N+2, N+3** първата релевантна цел, която трябва да се постигне, ще е през 2011 г.
- Най-тежката цел ще бъде през 2013 г., когато има застъпване на ангажиментите за 2010 г. (**N+3**) и 2011 г. (**N+2**). През 2013 г. пред ЕК трябва да бъдат представени искания за средства за реално извършени разходи на стойност 31.6% от целия ангажимент по ОП.
- Целите за годините 2013 г., 2014 г. и 2015 г. ще са трудни за постигане и това трябва да се вземе в предвид при планирането.

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

ЦЕЛИ НА ОПТП, ЗА ДА СЕ СПАЗИ ПРАВИЛОТО N+2, N+3

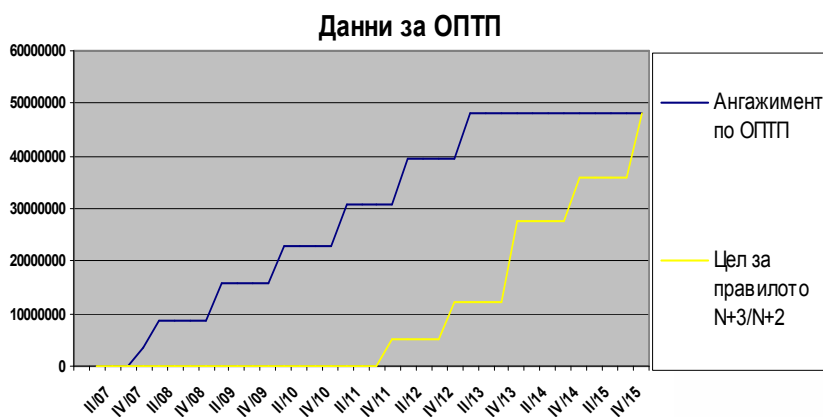

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

СИСТЕМАТА LOTNAR

- Системата LOTNAR е изготвена от ГД "Регионално развитие" на ЕК
- Комплексна система, съдържаща:
 - инструмент базиран на продукта MS Excel, който да помогне за създаването на прогнози за - сключването на договори с бенефициентите, плащанията към тях и сертифициране на разходите пред ЕК, и анализ и сравнение на тези прогнози с необходимите за постигане цели;
 - "флаш" таблици, които следят реалното изпълнение на ОП и дават възможност за съпоставяне с вече направени прогнози.

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ЦЕЛИ НА СИСТЕМАТА LOTNAR

- Да се предотврати загубата на средства поради прилагането на правилото **N+2, N+3**. Особено внимание трябва да се обърне на периода 2013-2015 г.
- Предварителен мониторинг, за да се установи изоставане, което би довело до загуба на средства в един ранен етап
- Навременно вземане на коригиращи действия за отстраняване на установени слабости

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА LOTNAR

- Проведено обучение на 9 април 2008 г. за служители на УО на отделните ОП от представители на ЕК
- Постигнато съгласие всеки един Управляващ орган да изготви своите прогнози и да ги представи на ЦКЗ до 1 май 2008 г.
- Изготвените прогнози за всяка една оперативна програма ще бъдат представени на следващия Комитет за наблюдение на НСРР

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА


ПРИОРИТЕТНА ОС 1

- Сключени договори към 31 май 2008 г. на стойност над 13 млн. лв.
- Подадените прогнози от бенефициентите показват, че ще бъдат сключени договори на стойност 31 млн. евро, при размер на разполагаемите средства по оста от 29.5 млн. евро
- Към 2015 г. се предвижда пълно усвояване на средствата по приоритетната ос

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГНОЗИТЕ

Приоритетна ос 1

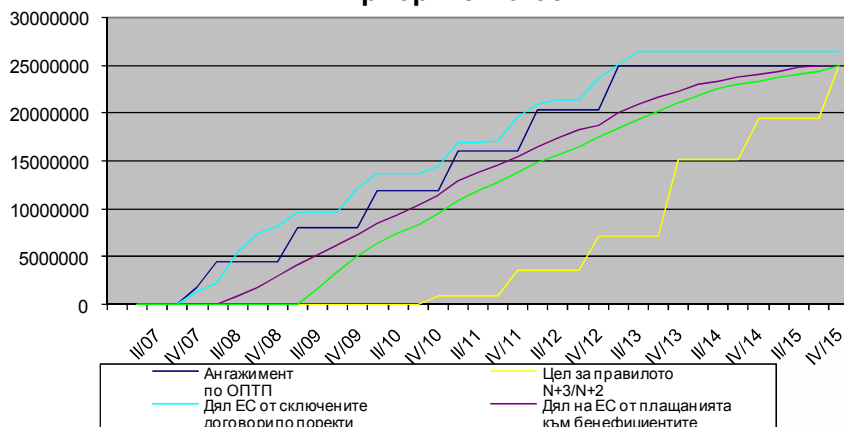

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А


ПРИОРИТЕТНА ОС 2

- Контрактувани до 31 май 2008 г. – 3 490 000 лв., в процес на одобрение са проекти на стойност близо 7 млн. лв.
- Дълъг период на отделните проекти, което води до забавяне на окончателните плащания към бенефициента
- Пълно усвояване на средствата към 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГНОЗИТЕ

Приоритетна ос 2

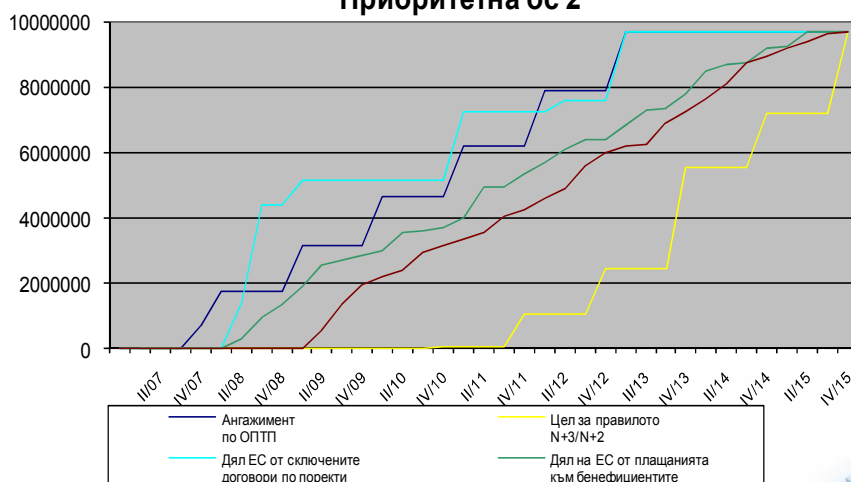

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А


ПРИОРИТЕТНА ОС 3

- Контрактувани към 31 май 2008 г. – 1,8 млн. лв.
- Предстои контрактуването на още над 8.5 млн. лв. до края на 2008 г.
- Пълно усвояване на средствата към 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГНОЗИТЕ

Приоритетна ос 3

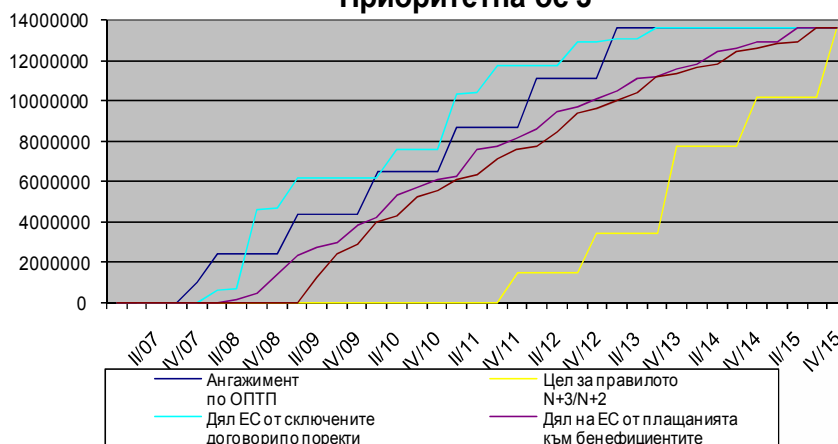

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

- Контрактувани към 31 май 2008 г. – 18.5 млн. лв.
- Планира се към края на 2008 г. да са контракувани близо 40 млн. лв.
- Към момента не се очаква да възникнат проблеми от правилото N+2/N+3
- Пълно усвояване на средствата към 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГНОЗИТЕ ПО ОПТП

Обобщени данни

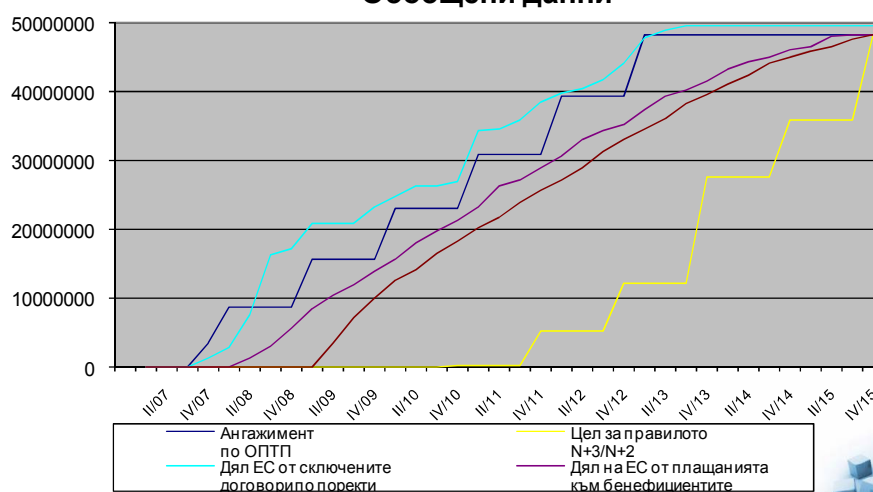

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

**БЛАГОДАРЯ ЗА
ВНИМАНИЕТО!**

